

**АКТ**  
**по результатам проверки расходования**  
**средств, выделенных Администрации Михайлоанненского сельсовета**  
**Советского района Курской области на строительство и реконструкцию**  
**(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в рамках**  
**контрольного мероприятия «Проверка исполнения бюджета**  
**муниципального района «Советский район» Курской области за 2023 год**  
**(совместно с Ревизионной комиссией муниципального района Советского**  
**района Курской области)»**

п. Садовый

14.06.2024 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 8 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области на 2024 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счётной палаты Курской области от 15.12.2023 года №23/7-2023, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Курской области от 09.04.2024 года №54 и от 23.04.2024 года №60.

**2. Цель контрольного мероприятия:** проверка использования бюджетных средств, выделенных Администрации Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

**3. Предмет контрольного мероприятия:** деятельность Администрации Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области по расходованию бюджетных средств.

**4. Объект контрольного мероприятия:** Администрация Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области.

**5. Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10.04.2024 года по 14.06.2024 года.

**7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

В 2022-2023 годах между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Администрацией Советского района Курской области заключено два соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету в целях достижения результата регионального проекта «Чистая вода» (завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, на объекте: «Реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района») в сумме 14 099,0 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 7 943,3 тыс. рублей (из них средства областного бюджета в сумме 7 406,7 тыс. рублей), в 2023 году – 6 155,7 тыс. рублей (из них средства областного бюджета в сумме 5 739,9 тыс. рублей).

В соответствии с соглашениями от 27.12.2021 года, от 27.12.2022 года, заключёнными между Администрацией Советского района Курской области и Администрацией Михайлоанненского сельсовета Советского района (далее –



Администрация Михайлоанненского сельсовета), сельсовету передана часть полномочий, в том числе в части организации водоснабжения.

Между Администрацией Советского района Курской области и Администрацией Михайлоанненского сельсовета в 2022-2023 годах заключены два соглашения, предметом которых является передача иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Советский район» на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета).

Общий объем средств, предусмотренных соглашениями, составил 14 099,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 6 155,7 тыс. рублей. Фактически исполнено сельсоветом 13 609,9 тыс. рублей (96,5% от предусмотренных средств), в том числе в 2023 году – 5 832,6 тыс. рублей:

Дата, номер соглашения (дополнительного соглашения)	Период	Предусмотрено соглашением		Исполнение	
		Всего	в том числе средства областного бюджета	Всего	в том числе средства областного бюджета
б/н от 27.01.2022 года (в ред. от 21.12.2022 года)	2022	7 943,3	7 406,7	7 777,3	7 252,0
б/н от 31.01.2023 года (в ред. от 28.12.2023 года)	2023	6 155,7	5 739,9	5 832,6	5 438,6
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 099,0</b>	<b>13 146,6</b>	<b>13 609,9</b>	<b>12 690,6</b>

Согласно акта технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения п. Садовый от 26.02.2020 года установлены следующие дефекты:

–водонапорные сети (1973 года постройки) – объект находится в аварийном состоянии, износ - 90% (заилинность труб, порывы, запорная арматура не в рабочем состоянии), дальнейшая эксплуатация невозможна;

–водонапорная башня (1973 года постройки) - объект находится в аварийном состоянии, износ - 90% (объект покрыт коррозией, имеются протечи, трещины, в гидрантах нет необходимого напора), дальнейшая эксплуатация невозможна;

–скважина (1988 года постройки) – износ составляет 40%, техническое состояние объекта оценивается как малонадежное.

Разработка проектной документации по реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета выполнена в 2020 году ООО «Курскстройпроект». В соответствии с разработанным проектом предусмотрено:

- строительство водозаборного узла, состоящего из:
  - одной водозаборной скважины глубиной до 107 метров;
  - одной подземной насосной станции на скважине с насосом производительностью 10 м<sup>3</sup>/час;
  - двух водонапорных башен емкостью бака 25 м<sup>3</sup> каждая и высотой ствола 18 м;



- подъездной дороги и благоустройства площадки водозабора;
- ограждения с устройством ворот и калитки;
- сетей электроснабжения и автоматики;
- строительство распределительной уличной сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
- устройство водонапорных колодцев с установкой в них запорной арматуры, пожарного гидранта.

Сметная стоимость реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района (согласно проектно-сметной документации) составила 16 715,5 тыс. рублей (с учетом НДС 20%) в ценах 3 квартала 2020 года.

В 2020 году АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» проведена экспертиза сметной стоимости, по результатам которой выдано положительное заключение №46-1-1-3-068711-2020 от 28.12.2020 года, в котором сметная стоимость по уровню цен 3 квартала 2020 года была откорректирована и составила 16 481,2 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта на реконструкцию системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района определена в сумме 15 554,6 тыс. рублей на основании проектно-сметного метода в соответствии со сводным сметным расчетом, составленным по уровню цен 3 квартала 2020 года с учетом индекса фактической и прогнозной инфляции на период выполнения работ, а также установлением понижающего коэффициента.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 17.03.2022 №247-па «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», распоряжением Администрации Советского района от 30.03.2022 года №128-р между Администрацией Михайлоанненского сельсовета и ООО «СтройГрад» заключен муниципальный контракт №1 от 01.04.2022 года на сумму 15 554,6 тыс. рублей, предметом которого является выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района».

Объем, содержание работ в рамках контракта №1 от 01.04.2022 года определены проектной документацией, сметой контракта (приложение №1 к контракту).

Пунктом 2.3.1 вышеуказанного муниципального контракта предусмотрен аванс в размере 4 666,4 тыс. рублей (30% от суммы контракта).

Срок выполнения работ определен в период с 01.04.2022 года по 31.07.2022 года.

В контракт №1 от 01.04.2022 года 12 раз вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений, в том числе:

- 5 раз в части изменения срока исполнения работ по контракту – в окончательной редакции до 01.09.2023 года;



- в части увеличения размера аванса, предусмотренного контрактом, до 7 777,3 тыс. рублей (50% от суммы контракта);
- внесения изменений в локально-сметные расчеты и сводный сметный расчет, предусмотренные контрактом (без изменения итоговой стоимости работ);
- в части изменений реквизитов сторон.

Стоит отметить, что изменение существенных условий муниципального контракта путем заключения дополнительных соглашений №1 от 26.07.2022, №2 от 27.09.2022, №3 от 24.10.2022 года и др. произведено без указания конкретных норм, предусмотренных действующим законодательством.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), между Администрацией Михайлоанненского сельсовета и ООО «СтройГрад» заключены дополнительные соглашения №6 от 30.11.2022, №7 от 27.12.2022, №10 от 29.06.2023 к муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года, которыми предусмотрено изменение срока исполнения работ по контракту до 31.12.2022, до 01.07.2023, до 01.09.2023 года, соответственно.

Стоит отметить, что пункт 9 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ предусматривает однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

**Таким образом, в нарушение пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ Администрация Михайлоанненского сельсовета заключила дополнительные соглашения №6 от 30.11.2022, №7 от 27.12.2022, №10 от 29.06.2023 к муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года, предусматривающие неоднократное изменение срока исполнения контракта на срок, превышающий срок исполнения контракта, предусмотренный при его заключении (пункт 4.41 «Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).**

Осуществление строительного контроля по реконструкции объекта: «Реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района» производило ФБУ «РосСтройКонтроль» в рамках муниципального контракта №02 от 11.04.2022 года.

ООО «СтройГрад» выполнил работы по контракту №1 от 01.04.2022 года и предоставил справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) на общую сумму 13 609,9 тыс. рублей, в том числе:

- от 10.08.2023 года на сумму 4 830,1 тыс. рублей;
- от 17.08.2023 года на сумму 2 768,2 тыс. рублей;
- от 13.12.2023 года на сумму 5 938,5 тыс. рублей;
- от 13.12.2023 года на сумму 73,1 тыс. рублей.



**Фактически работы завершены 13.12.2023 года (акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2)), то есть с превышением установленного срока (01.09.2023 года) на 104 дня, что является нарушением части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3.2 заключенного контракта (пункт 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).**

08.12.2023 года Администрация Михайлоанненского сельсовета выставила требование об уплате неустойки (пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту на сумму 370,7 тыс. рублей. Однако, согласно расчету, произведенному сотрудниками Контрольно-счетной палаты Курской области, указанная сумма составила 312,6 тыс. рублей (расчетная величина), что на 58,1 тыс. рублей меньше расчета, произведенного Администрацией Михайлоанненского сельсовета.

Согласно пояснительной записке, представленной заместителем Главы Администрации Михайлоанненского сельсовета, сумма пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года в размере 370,7 тыс. рублей не учтена на счете 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».

**В нарушение пункта 86 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н, пени с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года на сумму 370,7 тыс. рублей не отражены на счете 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).**

Согласно представленным пояснениям, на момент проведения контрольного мероприятия пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года в сумме 370,7 тыс. рублей подрядчиком не оплачены.

29.12.2023 года между Администрацией Михайлоанненского сельсовета и ООО «СтройГрад» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта №1 от 01.04.2022 года с объемом исполненных обязательств на сумму 13 609,9 тыс. рублей.

Администрацией Михайлоанненского сельсовета приняты и оплачены работы по контракту в полном объеме – 13 609,9 тыс. рублей, в том числе:

- п/п №593675 от 16.06.2022 года на сумму 4 666,4 тыс. рублей (аванс),
- п/п №592455 от 28.10.2022 года на сумму 3 110,9 тыс. рублей (аванс),
- п/п №750934 от 25.12.2023 года на сумму 2 415,0 тыс. рублей,
- п/п №750935 от 25.12.2023 года на сумму 1 384,1 тыс. рублей,
- п/п №748979 от 25.12.2023 года на сумму 36,6 тыс. рублей,
- п/п №762078 от 26.12.2023 года на сумму 1 996,9 тыс. рублей.



Пунктом 2.3.1 контракта установлено, что выплата аванса осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, при этом Администрацией Михайлоанненского сельсовета не соблюдены указанные условия в части авансового платежа в сумме 4 666,4 тыс. рублей (просрочка оплаты составила более 2 месяцев).

Вместе с тем, расчет за выполненные работы осуществляется по факту выполнения подрядчиком работ в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами первичных учетных документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) (пункт 2.3.2, 2.3.3 муниципального контракта)).

Таким образом, **в нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 2.3.3 контракта №1 от 01.04.2022 года Администрация Михайлоанненского сельсовета произвела оплату за фактически выполненные подрядчиком работы (ф. №КС-2, ф. КС-3 №1 от 10.08.2023 года, №2 от 17.08.2023 года) на сумму 3 799,1 тыс. рублей с нарушением установленного срока более 3 месяцев** (пункт 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями пунктов 7.1, 7.7 муниципального контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пена устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

**Вышеуказанное нарушение содержит риски неэффективного расходования средств местного бюджета в сумме пени 242,0 тыс. рублей (расчетная величина) в случае предъявления подрядчиком требования об уплате неустойки в связи с просрочкой сроком более 3 месяцев (122 дня в части оплаты на сумму 2 415,0 тыс. рублей, на 115 дней в части оплаты на сумму 84,9 тыс. рублей) окончательной оплаты Администрацией Михайлоанненского сельсовета выполненных работ.**

Гарантийный срок на объект составляет 3 года. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет подрядчика.

19.12.2023 года пописан акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (ф. КС-14).



В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2022 году в нарушение пунктов 79, 80 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н, Администрация Михайлоанненского сельсовета отразила аванс по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года в размере 7 777,3 тыс. рублей на счете 030228000 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений», вместо счета 020631000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств».

Кроме того, в нарушение пунктов 257, 258 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, пункта 102 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н, на указанную сумму аванса в размере 7 777,3 тыс. рублей сформированы вложения в основные средства на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» раньше срока их фактического получения (акты о приемке выполненных работ подписаны в 2023 году).

Вышеуказанные нарушения повлекли недостоверное отражение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Таким образом, в нарушение пунктов 7, 9, 16, 17 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года №191н, пункта 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года №256н, в ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» Администрацией Михайлоанненского сельсовета на начало 2023 года аванс по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года в сумме 7 777,3 тыс. рублей не отражен в составе дебиторской задолженности по строке 260, а также в строке 120 на указанную сумму недостоверно указан остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы», что обусловлено некорректным отражением фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета в 2022 году (пункт 2.9 «Нарушение общих требований к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).

Указанное нарушение не повлияло на искажение обобщенных показателей бухгалтерского баланса.

Также, в ходе проверки порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части расходов на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкции системы водоснабжения п. Садовый



Михайлоанненского сельсовета Советского района» в рамках муниципального контракта №1 от 01.04.2022 года установлено, что указанные расходы отнесены на КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в увязке с КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» в сумме 13 609,9 тыс. рублей.

Пунктом 11.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 года №209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», установлено, что расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов на реконструкцию основных средств, находящихся в муниципальной собственности, подлежат отнесению на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

Таким образом, в нарушение пункта 11.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 года №209н, расходы на выполнение реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района в сумме 13 609,9 тыс. рублей отнесены на КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» вместо КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (пункт 1.2.6 «Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации» группы 1 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 года №14 ПК).

Указанные выше нарушения повлекли за собой неверное отражение указанных расходов на счетах учета учреждения.

Так, в нарушение приказа Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н начисление расходов на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района в сумме 13 609,9 тыс. рублей отражено на счете баланса 030228000 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений» вместо счета 030231000 «Расчеты по приобретению основных средств» (пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).

При этом, вложения на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» в сумме 13 609,9 тыс. рублей отнесены на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», что соответствует нормативным документам, регулирующим правила ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.

По состоянию на 31.12.2023 года на счете баланса 010600000 «Вложения в основные средства» Администрацией Михайлоанненского сельсовета отражены расходы на реконструкцию объекта водоснабжения в общей сумме 14 049,9 тыс. рублей (с учетом расходов на проведение строительного контроля на объекте, согласно представленной карточке капитальных вложений в объект).



Объекты недвижимости, полученные в рамках мероприятия по реконструкции системы водоснабжения, оформлены в собственность муниципального образования «Михайлоанненский сельсовет» в 2024 году (2 водонапорные башни – 12.02.2024 года и 13.02.2024 года, сети водоснабжения – 13.02.2024 года, скважина – 13.02.2024 года).

В результате анализа документов, подтверждающих выполнение указанных работ, установлено, что ООО «СтройГрад» направил в адрес Администрации Михайлоанненского сельсовета гарантийное письмо №13/12 от 13.12.2023 года о выполнении следующих работ, предусмотренных ПСД:

устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей автоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см всего 6 см -23 м<sup>2</sup> (п. 493 ф.КС-2 №4 от 13.12.2023 года на сумму 1,8 тыс. рублей) до 01.06.2024 года;

разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 -140 м<sup>3</sup> ( п. 503 ф.КС-2 №4 от 13.12.2023 года на сумму 0,7 тыс. рублей) до 01.06.2024 года;

подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом – 747 м<sup>2</sup>(п. 535 ф. КС-2 №4 от 13.12.2023 года на сумму 5,1 тыс. рублей) до 01.06.2024 года;

посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 747 м<sup>2</sup> (п. 536 ф. КС-2 №4 от 13.12.2023 года на сумму 26,2 тыс. рублей) до 01.06.2024 года.


Согласно письму, направленному Администрацией Михайлоанненского сельсовета в адрес ООО «СтройГрад», от 17.05.2024 года по состоянию на 17.05.2024 года гарантийные обязательства от 13.12.2023 года подрядчиком не исполнены.

**Таким образом, в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией Михайлоанненского сельсовета приняты и оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму 48,4 тыс. рублей (в том числе смеси семян газонных трав на сумму 14,6 тыс. рублей) (пункт 4.45 «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года № 14ПК).**

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты Курской области совместно с Главой Администрации Михайлоанненского сельсовета 28.05.2024 года произведен осмотр выполненных работ на объекте: «Реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района», в ходе которого установлено:

- подъезд к объекту оборудован асфальтовым покрытием;
- территория водозаборного узла обнесена ограждением с воротами;



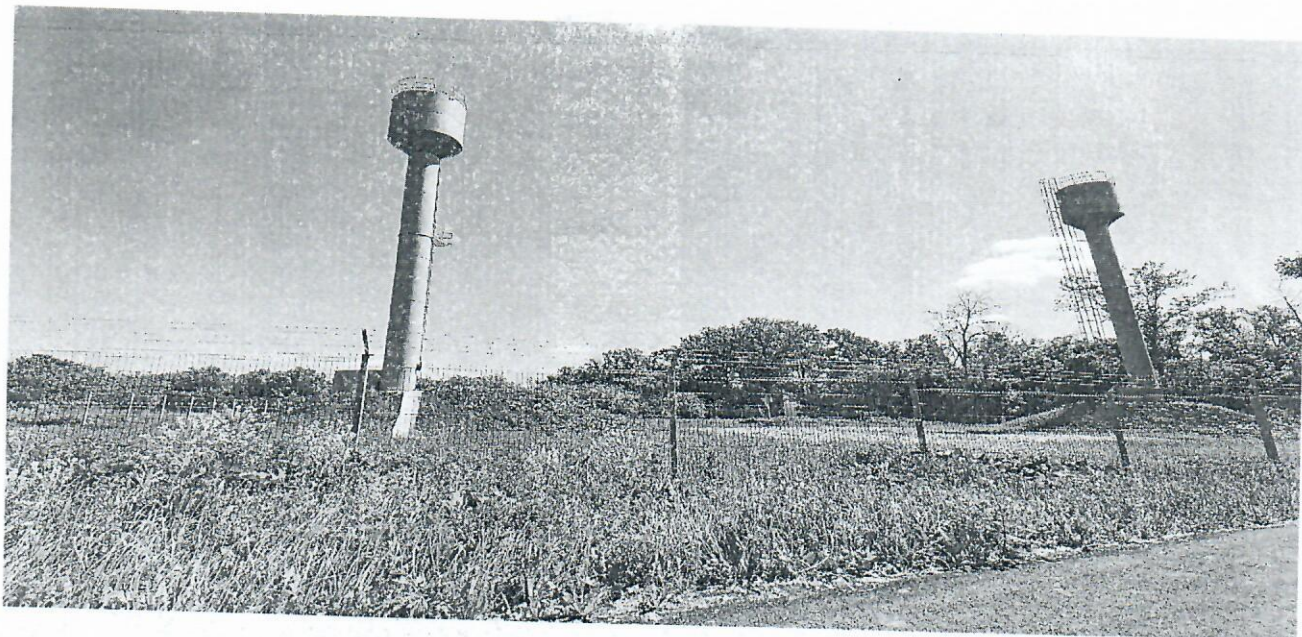

- озеленение (посадка травы) на территории водозабора, предусмотренное в рамках заключенного контракта, отсутствует.



При осмотре объекта сотрудниками Контрольно-счетной палаты Курской области 28.05.2024 года установлено, что эксплуатация скважины и водонапорных башен производится, при этом жители п. Садовый высказали жалобы в отношении качества воды, которая имеет неприятный запах и ржавый цвет.

Вместе с тем, согласно представленным протоколам лабораторных испытаний воды от 13.12.2023 года, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека.



Таким образом, общий объем расходов Администрации Михайлоанненского сельсовета, произведенных в 2022-2023 году в рамках реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Советский район» на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета), по состоянию на 31.12.2023 года составил 13 609,9 тыс. рублей, или 96,5% от утвержденных назначений, и 100,0% от фактически предоставленных средств.

Установленный соглашением результат использования иного межбюджетного трансферта: «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» выполнен в следующем порядке: плановое значение – 1 шт., фактическое – 0 шт.

**В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Представительного собрания Советского района от 21.12.2022 года, пункта 2.4.3 соглашения от 31.01.2023 года, заключенного с Администрацией Советского района Курской области, в целях строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, отчет о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов не содержит фактически достигнутое значение, установленное соглашением (завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, - 1 шт.)** (пункт 1.2.65 «Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за исключением нарушений по пункту 1.2.66)» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года № 14ПК).

## **8. Выводы.**

**8.1.** В 2022-2023 годах Администрацией Советского района Курской области предусмотрен иной межбюджетный трансферт Администрации Михайлоанненского сельсовета в общем объеме 14 099,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 6 155,7 тыс. рублей. Исполнение составило 13 609,9 тыс. рублей (96,5% от предусмотренных средств), в том числе в 2023 году – 5 832,6 тыс. рублей. Указанный межбюджетный трансферт предоставлен на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета).

**8.2.** В целях достижения значений представленного межбюджетного трансферта Администрацией Михайлоанненского сельсовета заключен муниципальный контракт №1 от 01.04.2022 года с ООО «СтройГрад» на сумму



13 609,9 тыс. рублей, предметом которого является выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района».

**8.3.** По итогам проверки использования Администрацией Михайлоанненского сельсовета средств иного межбюджетного трансферта, направленного в 2023 году на реконструкцию системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета, установлены следующие нарушения:

8.3.1. в части требований действующего законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг):

в нарушение пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ Администрация Михайлоанненского сельсовета заключила дополнительные соглашения №6 от 30.11.2022, №7 от 27.12.2022, №10 от 29.06.2023 к муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года, предусматривающие неоднократное изменение срока исполнения контракта на срок, превышающий срок исполнения контракта, предусмотренный при его заключении (*пункт 4.41 «Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК*);

в нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3.2 контракта №1 от 01.04.2022 года подрядчиком завершены работы 13.12.2023 года, то есть с превышением установленного срока (01.09.2023 года) на 104 дня (*пункт 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК*);

в нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, пункта 2.3.3. контракта №1 от 01.04.2022 года Администрация Михайлоанненского сельсовета произвела оплату за фактически выполненные подрядчиком работы (ф. №КС-2, ф. КС-3 №1 от 10.08.2023 года, №2 от 17.08.2023 года) на сумму 3 799,1 тыс. руб. с нарушением установленного срока более 4 месяцев (*пункт 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК*);

вышеуказанное нарушение содержит риски неэффективного расходования средств местного бюджета в сумме пени 242,0 тыс. рублей (расчетная величина) в случае предъявления подрядчиком требования об уплате неустойки в связи с просрочкой сроком более 3 месяцев (122 дня в части оплаты на сумму 2 415,0 тыс. рублей, на 115 дней в части оплаты на сумму 84,9 тыс. рублей) окончательной оплаты Администрацией Михайлоанненского сельсовета выполненных работ;

в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией Михайлоанненского сельсовета приняты и оплачены



фактически не выполненные работы на общую сумму 48,4 тыс. рублей (пункт 4.45 «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года № 14ПК).

8.3.2. в части соблюдения требований к ведению бухгалтерского (бюджетного) учета:

в нарушение пункта 86 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н, пени с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года на сумму 370,7 тыс. рублей не отражены на счете 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК);

в нарушение пунктов 7, 9, 16, 17 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года №191н, пункта 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года №256н, в ф. 0503130 Администрацией Михайлоанненского сельсовета на начало 2023 года аванс по муниципальному контракту №1 от 01.04.2022 года в сумме 7 777,3 тыс. рублей не отражен в составе дебиторской задолженности по строке 260, а также в строке 120 на указанную сумму недостоверно указан остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы», что обусловлено некорректным отражением фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета в 2022 году (пункт 2.9 «Нарушение общих требований к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК);

в нарушение приказа Минфина РФ от 06.12.2010 года №162н начисление расходов на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района в сумме 13 609,9 тыс. рублей отражено на счете баланса 030228000 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений» вместо счета 030231000 «Расчеты по приобретению основных средств» (пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК).



8.3.3. в части порядка применения классификации операций сектора государственного управления:

в нарушение пункта 11.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 года №209н, расходы на выполнение реконструкции системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района в сумме 13 609,9 тыс. рублей отнесены на КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» вместо КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (пункт 1.2.6 «Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации» группы 1 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 года №14 ПК).

8.3.4. в части оценки результатов использования бюджетных средств, выделенных Администрации Михайлоанненского сельсовета:


в нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Представительного собрания Советского района от 21.12.2022 года, пункта 2.4.3 соглашения от 31.01.2023 года, заключенного с Администрацией Советского района Курской области, в целях строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, отчет о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов не содержит фактически достигнутое значение, установленное соглашением (завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, - 1 шт.) (пункт 1.2.65 «Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за исключением нарушений по пункту 1.2.66)» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года № 14ПК).

Руководители контрольного мероприятия:



Аудитор Контрольно-счетной  
палаты Курской области

 Н.Н. Шарова

Председатель Ревизионной комиссии  
Советского района Курской области

 Л.В. Гудилина

Участники контрольного мероприятия:  
Заместитель начальника управления  
Главный инспектор

 О.А. Ветрова  
 И.В. Зайцева

С актом ознакомлены:  
Глава Администрации Михайлоанненского  
сельсовета Курской области

 С.В. Буланова
